


死亡労働災害速報（2021. 11）

（建災防宮城県支部）

重さ約 1 トンの機械装置を撤去中 移動式足場が倒壊し、下敷きとなる。			
発生日月	令和3年11月3日 午後3時45分頃		
業種	設備工事業	事業場規模	不明
事故の型	激突され	起因物	荷
発生状況	<p>3日午後3時45分頃、仙台市内の工場建屋の屋上で、重さ約1tの排ガス処理装置の一部を、移動足場2基に鋼製角パイプでかけ渡して設置したチェンブロックで吊り下げ、撤去作業を行っていたところ、移動式足場が崩れて、近くにいた作業員(36歳)が下敷きとなり、死亡した。</p> <p style="text-align: right;">（マスコミ報道より）</p>		
類似災害防止対策	<p>〔現在、関係機関で調査中のため、災害特有の一般的安全対策を列挙します。〕</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 倒壊、墜落、飛来落下等の防止の観点から安全な作業計画を定め、作業指揮者の指揮下で、作業を行わせること。 2. 作業計画について、リスクアセスメントを実施し、危険要因を洗い出したうえ、事前に十分な安全対策を講じること。 3. 移動式足場の組立に関しては、必ず構造計算を行い、積載荷重条件は作業床全体の荷重（等分布荷重）と局部荷重（集中荷重）とし、それぞれについて検討をすること。 4. 移動式足場に重量物、労働者を乗せたまま、移動しないこと。また、重量物を吊り下げる、重量物を吊ったまま移動させないこと。 5. 荷の吊り上げ、移動式足場の移動等の際は、落下・倒壊による危険範囲に、作業員を立ち入らせないこと。 6. 移動式足場の設置・取扱いについては、「移動式足場の安全基準に関する技術上の指針」を遵守すること。 		

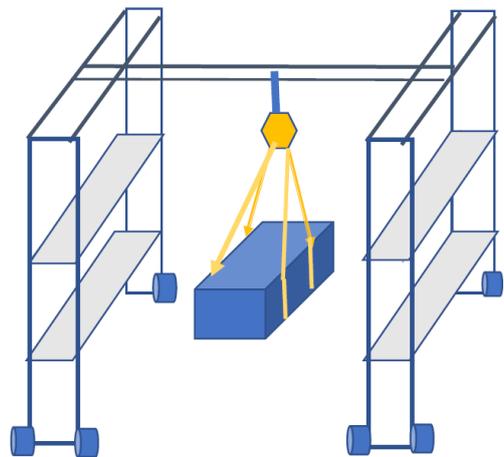

図はイメージで、実際の事故状況と異なる場合があります。
